

1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-DIPE

1º BOLETIM DE MEDICAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOÇIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 07



Foto 08



Foto 09




Foto 10



Foto 11



Foto 12

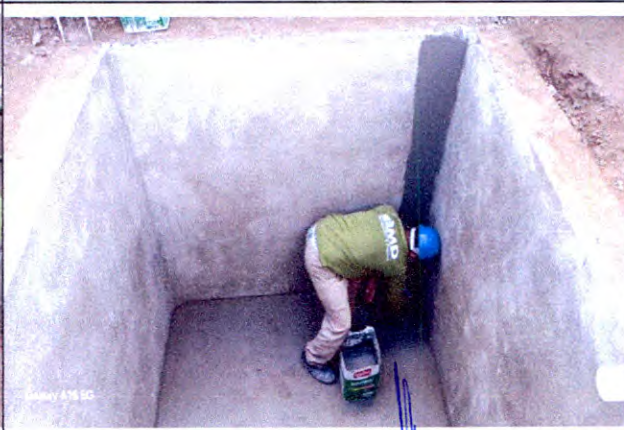

F.F.P.
Paulo de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/P/E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 13



Foto 14



Foto 15

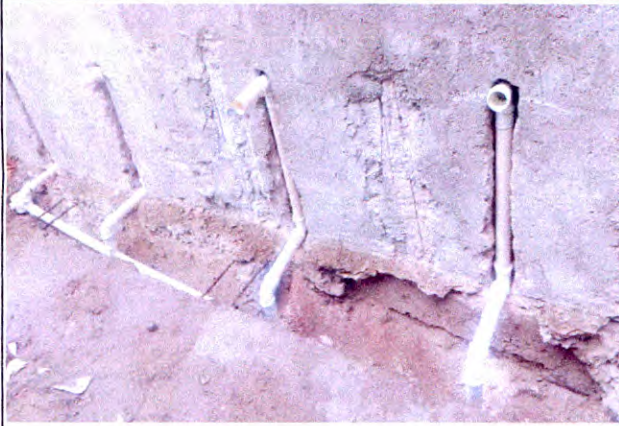


Foto 16


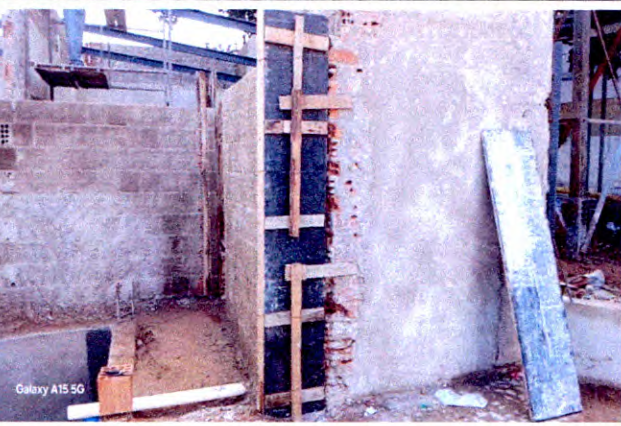


Foto 17



Foto 18

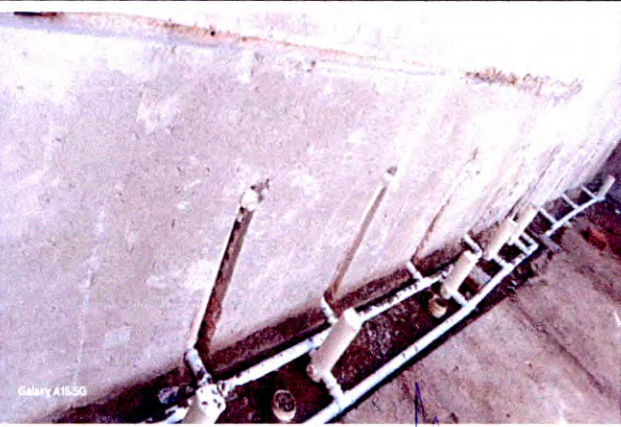

FABIO
Fábio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 026809-DPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE																					
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																					
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA				DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025				LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses			PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/04/2025 à 21/05/2025		DATA: 21/05/2025				
CNPJ: 35.978.627/0001-04								PROCESSO LICITATÓRIO: 032/2025				CONCURRENÇA ELETRÔNICA: 002/2025			CONTRATO: 093/2025			VALOR DO CONTRATO: R\$ 396.986,55		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 121.368,88	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				PLANILHA CONTRATUAL				QUANTIDADES MEDIDAS				VALORES MEDIDOS (R\$)			SALDO A MEDIR						
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%						
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	R\$ 5.067,67	R\$ 6.207,89	R\$ 24.831,56		2,77	2,77	R\$ -	R\$ 17.178,47	R\$ 17.178,47	1,23	R\$ 7.653,09	30,82%						
2.0	PLACA DE OBRA																				
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	m²	6,00	R\$ 315,84	R\$ 386,90	R\$ 2.321,40		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 2.321,40	R\$ 2.321,40	0,00	R\$ -	0,00%						
3.0	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES																				
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	25,46	R\$ 54,38	R\$ 66,61	R\$ 1.695,89		25,46	25,46	R\$ -	R\$ 1.695,89	R\$ 1.695,89	0,00	R\$ -	0,00%						
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	173,67	R\$ 6,46	R\$ 7,91	R\$ 1.373,72		173,67	173,67	R\$ -	R\$ 1.373,72	R\$ 1.373,72	0,00	R\$ -	0,00%						
3.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	108,79	R\$ 10,95	R\$ 13,41	R\$ 1.458,87		108,79	108,79	R\$ -	R\$ 1.458,87	R\$ 1.458,87	0,00	R\$ -	0,00%						
3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	24,87	R\$ 191,17	R\$ 234,18	R\$ 5.824,05		24,87	24,87	R\$ -	R\$ 5.824,05	R\$ 5.824,05	0,00	R\$ -	0,00%						
3.5	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	100,12	R\$ 3,40	R\$ 4,16	R\$ 416,49		100,12	100,12	R\$ -	R\$ 416,49	R\$ 416,49	0,00	R\$ -	0,00%						
3.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	100,12	R\$ 7,34	R\$ 8,99	R\$ 900,07		100,12	100,12	R\$ -	R\$ 900,07	R\$ 900,07	0,00	R\$ -	0,00%						
3.7	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	12,01	R\$ 80,24	R\$ 98,29	R\$ 1.180,46		12,01	12,01	R\$ -	R\$ 1.180,46	R\$ 1.180,46	0,00	R\$ -	0,00%						
3.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	22,18	R\$ 9,15	R\$ 11,20	R\$ 248,41		22,18	22,18	R\$ -	R\$ 248,41	R\$ 248,41	0,00	R\$ -	0,00%						
3.9	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	10,00	R\$ 12,11	R\$ 14,83	R\$ 148,30		10,00	10,00	R\$ -	R\$ 148,30	R\$ 148,30	0,00	R\$ -	0,00%						
3.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	22,00	R\$ 1,72	R\$ 2,10	R\$ 46,20		22,00	22,00	R\$ -	R\$ 46,20	R\$ 46,20	0,00	R\$ -	0,00%						
3.11	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO [REF.: ORSE - 26 - 11/2024]	M³	59,29	R\$ 20,59	R\$ 25,22	R\$ 1.495,29		59,29	59,29	R\$ -	R\$ 1.495,29	R\$ 1.495,29	0,00	R\$ -	0,00%						
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																				
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	8,71	R\$ 81,44	R\$ 99,76	R\$ 868,90		8,71	8,71	R\$ -	R\$ 868,90	R\$ 868,90	0,00	R\$ -	0,00%						
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m³	14,73	R\$ 5,99	R\$ 7,33	R\$ 107,97		14,73	14,73	R\$ -	R\$ 107,97	R\$ 107,97	0,00	R\$ -	0,00%						
4.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	4,59	R\$ 23,69	R\$ 29,02	R\$ 133,20		4,59	4,59	R\$ -	R\$ 133,20	R\$ 133,20	0,00	R\$ -	0,00%						
4.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	m³	3,02	R\$ 57,70	R\$ 70,68	R\$ 213,45		3,02	3,02	R\$ -	R\$ 213,45	R\$ 213,45	0,00	R\$ -	0,00%						
5.0	INFRAESTRUTURA																				
5.1	SAPATAS																				
5.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	1,44	R\$ 30,97	R\$ 37,93	R\$ 54,61		1,44	1,44	R\$ -	R\$ 54,61	R\$ 54,61	0,00	R\$ -	0,00%						
5.1.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]	M³	0,60	R\$ 1.820,21	R\$ 2.229,75	R\$ 1.337,85		0,60	0,60	R\$ -	R\$ 1.337,85	R\$ 1.337,85	0,00	R\$ -	0,00%						
5.2	EMBASEAMENTO																				
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	12,17	R\$ 30,97	R\$ 37,93	R\$ 461,60		12,17	12,17	R\$ -	R\$ 461,60	R\$ 461,60	0,00	R\$ -	0,00%						
5.2.2	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]	M³	25,33	R\$ 80,13	R\$ 98,15	R\$ 2.486,13		25,33	25,33	R\$ -	R\$ 2.486,13	R\$ 2.486,13	0,00	R\$ -	0,00%						
6.0	SUPERESTRUTURA																				
6.1	ALVENARIA																				
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m³	146,45	R\$ 76,47	R\$ 93,67	R\$ 13.717,97		146,45	146,45	R\$ -	R\$ 13.717,97	R\$ 13.717,97	0,00	R\$ -	0,00%						
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	m³	3,98	R\$ 171,03	R\$ 209,51	R\$ 833,84		3,98	3,98	R\$ -	R\$ 833,84	R\$ 833,84	0,00	R\$ -	0,00%						
6.2	VERGAS E CONTRAVERGAS																				
6.2.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE *15" CM. AF. 03/2024	M	6,40	R\$ 18,29	R\$ 22,40	R\$ 143,36		6,40	6,40	R\$ -	R\$ 143,36	R\$ 143,36	0,00	R\$ -	0,00%						
6.2.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESURA DE *15" CM. AF. 03/2024	M	10,55	R\$ 17,98	R\$ 22,02	R\$ 232,31		10,55	10,55	R\$ -	R\$ 232,31	R\$ 232,31	0,00	R\$ -	0,00%						
6.3	VIGAS SUPERIORES																				
6.3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa [REF.: SINAPI - 104488 - 02/2024]	M³	2,40	R\$ 1.820,21	R\$ 2.229,75	R\$ 5.351,40		2,40	2,40	R\$ -	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	0,00	R\$ -	0,00%						
6.4	LAJE																				
6.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18+31. AF. 11/2020 PA	m²	100,12	R\$ 133,91	R\$ 164,03	R\$ 16.422,68			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,12	R\$ 16.422,68	100,00%						
7.0	SISTEMA DE COBERTA																				


Fábio de A. Lustos,
Engenheiro Civil
CREA 026809-DPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA			DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025			LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE			VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses			PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/04/2025 à 21/05/2025			DATA: 21/05/2025		
CNPJ: 35.978.627/0001-04			OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE			PROCESSO LICITATÓRIO: 032/2025			CONFERÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025			VALOR DO CONTRATO: R\$ 396.946,55			VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 121.368,88		
SÃO FELIX - PE																	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SAÍDA A MEDIR	%	
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO INTERIORES, REF.: SINAPI - 82282 - 12/2024.	M²	95,05	R\$ 72,28	R\$ 88,54	R\$ 8.415,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	95,05	R\$ 8.415,72		100,00%	
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE: 50 X 50 CM, ANTIDEBRAMANTE (PODEREAMTOL), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIV. REGULARIZAÇÃO DE BASE (REF.: ORSE - 8928 - 11/2024)	M²	10,08	R\$ 59,84	R\$ 73,30	R\$ 738,86			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,08	R\$ 738,86		100,00%	
9.5	SOLTEIRA EM GABITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	5,20	R\$ 92,59	R\$ 113,42	R\$ 589,78			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,20	R\$ 589,78		100,00%	
10.0	ESQUADRIAS																
10.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUIARNIÇÃO, FINAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	31,58	R\$ 305,27	R\$ 373,95	R\$ 11.809,34			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,58	R\$ 11.809,34		100,00%	
10.2	LANEJAS DE ALUMÍNIO E VIDRO																
10.2.1	LANEJA TIPO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATEENTE E FERREJOS, EXCLUSIV. ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FINAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m²	4,58	R\$ 380,72	R\$ 368,38	R\$ 1.687,18			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,58	R\$ 1.687,18		100,00%	
10.3	GRADIS																
10.3.1	GRADIL / GRADIL EM METALON FOGADA EM ALUMINIA OU CONCRETO (REF.: ORSE - 4735 - 11/2024)	M²	8,36	R\$ 225,46	R\$ 276,18	R\$ 2.308,86			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,36	R\$ 2.308,86		100,00%	
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
11.1	ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																
11.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBURUL, CABO DE 25 MM² E DISJUNTOR DIN 50 (NÃO INCLUI DO DISJUNTOR, EM PQC DE EMBURUL, COM BARBAMENTO TERRA / NEUTRO PARA OS DISJUNTORES DIN - 12/2024)	UN	1,00	R\$ 1.200,74	R\$ 1.470,90	R\$ 1.470,90			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.470,90	0,00	R\$ -		0,00%	
11.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PQC DE EMBURUL, COM BARBAMENTO TERRA / NEUTRO PARA OS DISJUNTORES DIN - 12/2024	UN	1,00	R\$ 114,00	R\$ 139,65	R\$ 139,65			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 139,65		100,00%	
11.1.3	BARBAMENTO TERRA / NEUTRO PARA 16 DISJUNTORES DIN - 12/2024	UN	1,00	R\$ 170,66	R\$ 209,05	R\$ 209,05			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,05	0,00	R\$ -		0,00%	
11.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COERENTE NOMINAL DE 32A - 12/2024	UN	11,00	R\$ 10,61	R\$ 12,99	R\$ 142,89			11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,89	0,00	R\$ -		0,00%	
11.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COERENTE NOMINAL DE 16A - 12/2024	UN	1,00	R\$ 13,11	R\$ 16,05	R\$ 16,05			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	0,00	R\$ -		0,00%	
11.1.6	DISJUNTOR TIPO DIN, COERENTE NOMINAL DE 40A - 12/2024	UN	1,00	R\$ 76,46	R\$ 93,66	R\$ 93,66			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,66	0,00	R\$ -		0,00%	
11.1.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMINIA COM TUDO OS FERRAMENTOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 12X12X12 CM. AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 132,81	R\$ 162,69	R\$ 162,69			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,69	0,00	R\$ -		0,00%	
11.1.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM PROTEÇÃO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 29,15	R\$ 35,70	R\$ 35,70			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,70	0,00	R\$ -		0,00%	
11.1.9	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	3,00	R\$ 74,32	R\$ 91,04	R\$ 273,12			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,12	0,00	R\$ -		0,00%	
11.1.10	CONECTOR GRADIL METALICO TIPO QUAL, PARA SPDA, PARA MASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"	UN	1,00	R\$ 14,89	R\$ 18,24	R\$ 18,24			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,24	0,00	R\$ -		0,00%	
11.2	CABOS E ELETRONÍUTOS																
11.2.1	ELETRONÍUTOS TIPO ELÉTRICO, PQC DIN 25 MM² (3x4/1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	94,50	R\$ 15,84	R\$ 19,40	R\$ 1.833,30			94,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.833,30	0,00	R\$ -		0,00%	
11.2.2	ELETRONÍUTOS TIPO ELÉTRICO, PQC DIN 25 MM² (3x4/1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	16,80	R\$ 8,47	R\$ 10,37	R\$ 174,21			16,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,21	0,00	R\$ -		0,00%	
11.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-GEL, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	180,71	R\$ 2,34	R\$ 2,86	R\$ 516,83			180,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 516,83	0,00	R\$ -		0,00%	
11.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3,5 MM², ANTI-GEL, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	255,15	R\$ 3,34	R\$ 4,09	R\$ 1.043,56			255,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.043,56	0,00	R\$ -		0,00%	
11.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-GEL, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	25,20	R\$ 5,09	R\$ 6,23	R\$ 156,99			25,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,99	0,00	R\$ -		0,00%	
11.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-GEL, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	58,80	R\$ 7,06	R\$ 8,64	R\$ 508,03			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	58,80	R\$ 508,03		100,00%	
11.3	PONTOS ELÉTRICOS																
11.3.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 7" BAIXA (30 MM DO PISO) PQC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	UN	26,00	R\$ 16,63	R\$ 20,37	R\$ 529,62			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	26,00	R\$ 529,62		100,00%	
11.3.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 7" BAIXA (30 MM DO PISO) PQC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	UN	4,00	R\$ 10,63	R\$ 13,07	R\$ 52,08			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 52,08		100,00%	

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 35.978.627/0001-04
RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, 100 - JARDIM
CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE, 55.000-000

DAVI WILSON LUCENA DO
CNPJ: 0.01327337/495-
RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, 100 - JARDIM
CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE, 55.000-000

Fábio de A. Lages
Engenheiro Civil
CREA 066809-DPE

121.368,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA CNPJ: 35.978.627/0001-04	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/04/2025 à 21/05/2025	DATA: 21/05/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	PROCESSO LICITATÓRIO: 032/2025	CONCURRENCIA ELETRÔNICA: 002/2025	CONTRATO: 093/2025	VALOR DO CONTRATO: R\$ 396.986,55	VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 121.368,88

PLANILHA CONTRATUAL							QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R\$)			SALDO A MEDIR		
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
11.3.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 16,75	R\$ 20,51	R\$ 164,08			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 164,08	100,00%
11.3.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 29,25	R\$ 35,83	R\$ 429,96			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 429,96	100,00%
11.3.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 23,78	R\$ 29,13	R\$ 145,65			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 145,65	100,00%
11.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 35,90	R\$ 43,97	R\$ 43,97			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 43,97	100,00%
11.3.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 24,80	R\$ 30,38	R\$ 121,52			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 121,52	100,00%
11.3.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 28,42	R\$ 34,81	R\$ 69,62			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 69,62	100,00%
11.3.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 37,78	R\$ 46,28	R\$ 370,24			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 370,24	100,00%
11.3.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 39,03	R\$ 47,81	R\$ 191,24			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 191,24	100,00%
11.4	LUMINÁRIAS														
11.4.1	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 40W, QUADRADA, 6500K DA G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 12971 - 11/2024]	UND	22,00	R\$ 254,72	R\$ 312,03	R\$ 6.864,66			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,00	R\$ 6.864,66	100,00%
11.4.2	REFLETOR SLIM LED 100 W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500 K, G-LIGHT OU SIMILAR [REF.: ORSE - 13148 - 11/2024]	UND	2,00	R\$ 64,19	R\$ 78,63	R\$ 157,26			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 157,26	100,00%
11.4.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W [REF.: ORSE - 10352 - 12/2024]	UND	4,00	R\$ 87,54	R\$ 107,23	R\$ 428,92			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 428,92	100,00%
11.5	AR-CONDICIONADOS E CÂMERAS														
11.5.1	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PL	UN	6,00	R\$ 2.014,82	R\$ 2.468,15	R\$ 14.808,90			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 14.808,90	100,00%
11.5.2	CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR [REF.: ORSE - 13597 - 12/2024]	UND	6,00	R\$ 191,40	R\$ 234,46	R\$ 1.406,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.406,76	100,00%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
12.1	PONTOS HIDROSSANITÁRIOS														
12.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUI DOSSAGIO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA [REF.: SINAPI - 89957 - 02/2024]	UND	32,00	R\$ 119,90	R\$ 146,87	R\$ 4.699,84		32,00	32,00	R\$ -	R\$ 4.699,84	R\$ 4.699,84	0,00	R\$ -	0,00%
12.1.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) [REF.: ORSE - 1679 - 11/2024]	UND	22,00	R\$ 62,51	R\$ 76,57	R\$ 1.684,54		22,00	22,00	R\$ -	R\$ 1.684,54	R\$ 1.684,54	0,00	R\$ -	0,00%
12.1.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) [REF.: ORSE - 1683 - 11/2024]	UND	9,00	R\$ 78,46	R\$ 96,11	R\$ 864,99		9,00	9,00	R\$ -	R\$ 864,99	R\$ 864,99	0,00	R\$ -	0,00%
12.1.4	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 12,97	R\$ 15,88	R\$ 95,28		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 95,28	R\$ 95,28	0,00	R\$ -	0,00%
12.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R\$ 66,10	R\$ 80,97	R\$ 566,79		7,00	7,00	R\$ -	R\$ 566,79	R\$ 566,79	0,00	R\$ -	0,00%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00	R\$ 14,49	R\$ 17,75	R\$ 355,00		20,00	20,00	R\$ -	R\$ 355,00	R\$ 355,00	0,00	R\$ -	0,00%
12.2	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO														
12.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 330,55	R\$ 404,92	R\$ 2.834,44			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 2.834,44	100,00%
12.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 502,87	R\$ 616,01	R\$ 1.232,02			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 1.232,02	100,00%
12.2.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 22,92	R\$ 28,07	R\$ 252,63			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 252,63	100,00%
12.2.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 168,33	R\$ 206,20	R\$ 1.855,80			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 1.855,80	100,00%
12.2.5	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 475,90	R\$ 582,97	R\$ 2.914,85			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 2.914,85	100,00%
12.2.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 110,49	R\$ 135,35	R\$ 1.218,15			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 1.218,15	100,00%
12.2.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 76,46	R\$ 93,66	R\$ 187,32			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 187,32	100,00%
12.2.8	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 14,36	R\$ 17,59	R\$ 17,59			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 17,59	100,00%
12.2.9	CHUVEIRO REDONDO EM ALUMÍNIO 10", LAMINADO POLIDO, PROLÁZER OU SIMILAR, COM REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO [REF.: ORSE - 13440 - 11/2024]	UND	6,00	R\$ 173,14	R\$ 212,09	R\$ 1.272,54			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.272,54	100,00%

Fel
Fábio de A. Lucena
Engenheiro Civil
CREA 026809-DPE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO



CONTRATANTE: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES LTDA										DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2023		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOÇIM DE SÃO FÉLIX - PE		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025		CONTRATO: 093/2025		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/04/2023 a 21/05/2025		DATA: 21/05/2025																	
CNPJ: 35.978.627/0001-04										OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOÇIM DE SÃO FÉLIX - PE										VALOR DO CONTRATO: R\$ 396.986,55		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$		121.968,48															
SÃO FÉLIX - PE																																							
CÓDIGO										PLANTIA CONTRATUAL										QUANTIDADES MEDIDAS		VALORES MEDIDOS (R\$)		SALDO A MEDIR															
DESCRIÇÃO										UNIDADE										QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO COM IPI		VALORES TOTAIS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL		VALORES MEDIDOS (R\$)		QUANTIDADE		VALORES		%	
12.2.10										BARRA DE AÇO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, TROCA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020										UN		8,00		R\$ 231,71		R\$ 231,71		R\$ 2.319,52						8,00		R\$ 2.319,52		100,00%	
12.2.11										BARRA DE AÇO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, TROCA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020										UN		4,00		R\$ 245,47		R\$ 300,70		R\$ 1.202,80						4,00		R\$ 1.202,80		100,00%	
12.2.12										FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) TUBOS DE 1/2" DE DIÂMETRO EM AÇO INOX, TUBO NA PAREDE - INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF: ORSE - 1191 - 11/2024)										UN		2,00		R\$ 201,61		R\$ 859,47		R\$ 1.718,94						2,00		R\$ 1.718,94		100,00%	
12.2.13										FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) TUBOS DE 1/2" DE DIÂMETRO EM AÇO INOX, TUBO NA PAREDE - INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF: ORSE - 1191 - 11/2024)										M²		61,29		R\$ 504,50		R\$ 618,01		R\$ 37.877,83						61,29		R\$ 37.877,83		100,00%	
12.2.14										PAREDEIRA DE PAREDE EM METAL CRÔMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. AF: 01/2020										UN		9,00		R\$ 57,97		R\$ 71,01		R\$ 639,09						9,00		R\$ 639,09		100,00%	
12.3										CABOS D'ÁGUA, CABOS ENTERRADOS E SISTEMA																													
12.3.1										CABO D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS INCLUSIVE TUBOS, CONEXÕES E TUBERIA DE BOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020										UN		2,00		R\$ 517,78		R\$ 634,78		R\$ 1.286,56						2,00		R\$ 1.286,56		100,00%	
12.3.2										TUBOS DE 1/2" DE DIÂMETRO EM AÇO INOX, TUBOS NA PAREDE - INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF: ORSE - 1191 - 11/2024)										UN		2,00		R\$ 446,54		R\$ 547,01		R\$ 1.094,02						2,00		R\$ 1.094,02		100,00%	
12.3.3										EXECUÇÃO DE ESTRUTURA ENTERRADA, ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO E ESTRUTURA DE CONCRETO, CAPACIDADE PARA ATÉ 8.000 LITROS.										UN		1,00		R\$ 6.458,50		R\$ 7.911,66		R\$ 7.911,66		1,00				1,00		R\$ 7.911,66		0,00%	
12.3.4										BOA ELÉTRICA PARA RESERVAÇÃO SUPERIOR, MARCA AQUARIATIC 11/2024										UN		1,00		R\$ 1.204,90		R\$ 1.476,00		R\$ 1.476,00						1,00		R\$ 1.476,00		100,00%	
12.3.5										BOA ELÉTRICA PARA RESERVAÇÃO SUPERIOR, MARCA AQUARIATIC 11/2024										UN		1,00		R\$ 317,88		R\$ 389,40		R\$ 389,40						1,00		R\$ 389,40		100,00%	
13.0										PINTURA																													
13.1										PINTURA																													
13.1.1										PINTURA DE ACABAMENTO EM PAREDE, UMA COBERTURA DE 100 M²										M²		144,65		R\$ 3,39		R\$ 415		R\$ 600,29						144,65		R\$ 600,29		100,00%	
13.1.2										PINTURA DE ACABAMENTO EM PAREDE, DUAS COBERTURAS DE 100 M²										M²		71,40		R\$ 14,60		R\$ 17,88		R\$ 1.276,63						71,40		R\$ 1.276,63		100,00%	
13.1.3										PINTURA DE ACABAMENTO EM PAREDE, DUAS COBERTURAS DE 100 M²										M²		144,65		R\$ 10,50		R\$ 12,86		R\$ 1.860,19						144,65		R\$ 1.860,19		100,00%	
13.2										PINTURA DE ACABAMENTO EM PAREDE, UMA COBERTURA DE 100 M²										M²		89,42		R\$ 4,38		R\$ 3,74		R\$ 468,56						89,42		R\$ 468,56		100,00%	
13.2.2										PINTURA DE ACABAMENTO EM PAREDE, DUAS COBERTURAS DE 100 M²										M²		89,42		R\$ 27,50		R\$ 33,68		R\$ 3.011,66						89,42		R\$ 3.011,66		100,00%	
13.2.3										PINTURA DE ACABAMENTO EM PAREDE, DUAS COBERTURAS DE 100 M²										M²		89,42		R\$ 12,65		R\$ 15,49		R\$ 1.385,11						89,42		R\$ 1.385,11		100,00%	
13.3										SUPERFÍCIE METÁLICA																													
13.3.1										PINTURA COM TINTA ALCOBÚCA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLÔ DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) DEFEITO NA TUBERIA (FORA DE USO). AF: 01/2020										M²		16,71		R\$ 21,76		R\$ 26,65		R\$ 445,32						16,71		R\$ 445,32		100,00%	
13.3.2										PINTURA COM TINTA ALCOBÚCA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO) APLICADA A ROLÔ DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) DEFEITO NA TUBERIA (FORA DE USO). AF: 01/2020										M²		16,71		R\$ 44,35		R\$ 54,32		R\$ 907,68						16,71		R\$ 907,68		100,00%	
14.0										ESPALDO CRISTAL ESPESSURA 6 MM, COM AQUIDUA EM ALUMÍNIO E FECHADO COM PARAFUSOS (REF: SINAPI - 7412/002 E 85005-1-12/2020)										M²		3,60		R\$ 358,67		R\$ 499,37		R\$ 1.581,73						3,60		R\$ 1.581,73		100,00%	
14.1										GUARDA-CORPO PAINELADO COM PERIS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10 MM, TROCO COM CHUVADEIRO MECÂNICO (REF: SINAPI - 2981 - 11/2024)										M		9,60		R\$ 552,40		R\$ 676,69		R\$ 6.496,22						9,60		R\$ 6.496,22		100,00%	
14.2										GUARDA-CORPO PAINELADO COM PERIS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10 MM, TROCO COM CHUVADEIRO MECÂNICO (REF: SINAPI - 2981 - 11/2024)										M²		4,12		R\$ 331,24		R\$ 405,76		R\$ 1.671,73						4,12		R\$ 1.671,73		100,00%	
14.3										FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) TUBOS DE 1/2" DE DIÂMETRO EM AÇO INOX, TUBO NA PAREDE - INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF: ORSE - 1191 - 11/2024)										UN		1,00		R\$ 795,30		R\$ 974,24		R\$ 974,24						1,00		R\$ 974,24		100,00%	
14.4										ESPALDAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO AF: 01/2024										M³		10,52		R\$ 2,30		R\$ 3,06		R\$ 32,19						10,52		R\$ 32,19		100,00%	
15.2										APLICAÇÃO DE ADOMO EM SÓCO AF: 07/2024										M²		10,52		R\$ 3,49		R\$ 4,27		R\$ 44,92						10,52		R\$ 44,92		100,00%	
15.3										FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) TUBOS DE 1/2" DE DIÂMETRO EM AÇO INOX, TUBO NA PAREDE - INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF: ORSE - 1191 - 11/2024)										UN		22,00		R\$ 14,27		R\$ 17,48		R\$ 384,56						22,00		R\$ 384,56		100,00%	
15.4										FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTIO DO TIPO MARIA-SEM VORÇONIA (IMBUTIENTES VALETERIA) (REF: ORSE - 11304 - 12/2024)										UN		14,00		R\$ 6,40		R\$ 7,84		R\$ 109,76						14,00		R\$ 109,76		100,00%	
15.5										FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTIO DO TIPO CORAÇÃO MAGDOLINO (BREVES REFERÊNCIA) (REF: ORSE - 11206 - 12/2024)										UN		12,00		R\$ 37,33		R\$ 45,35		R\$ 550,20						12,00		R\$ 550,20		100,00%	

FABIO
Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-DP

**M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS**

Atividade profissional em M M DA SILVA, 12-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-10

DAVI WILSON
LUCENA DO
0:01327337495

Página 5 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA CNPJ: 35.978.627/0001-04	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/04/2025 à 21/05/2025	DATA: 21/05/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	PROCESSO LICITATÓRIO: 032/2025	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025	CONTRATO: 093/2025	VALOR DO CONTRATO: R\$ 396.986,55	VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 121.368,88

PLANILHA CONTRATUAL							QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R\$)			SALDO A MEDIR		
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
15.6	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA DO TIPO MANACÁ DE CHEIRO (BRUNFELSA UNIFLORA) [REF.: ORSE - 8956 - 12/2024]	UND	1,00	R\$ 95,31	R\$ 116,75	R\$ 116,75			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 116,75	100,00%
16.0	ÁREA EXTERNA														
16.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES														
16.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	1,98	R\$ 54,38	R\$ 66,61	R\$ 131,88		1,98	1,98	R\$ -	R\$ 131,88	R\$ 131,88	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.2	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO [REF.: ORSE - 4942 - 12/2024]	M²	30,81	R\$ 23,26	R\$ 28,49	R\$ 877,77		30,81	30,81	R\$ -	R\$ 877,77	R\$ 877,77	0,00	R\$ -	0,00%
16.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
16.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	m³	2,45	R\$ 81,44	R\$ 99,76	R\$ 244,41		2,45	2,45	R\$ -	R\$ 244,41	R\$ 244,41	0,00	R\$ -	0,00%
16.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	m²	5,45	R\$ 5,99	R\$ 7,33	R\$ 39,94		5,45	5,45	R\$ -	R\$ 39,94	R\$ 39,94	0,00	R\$ -	0,00%
16.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	3,72	R\$ 23,69	R\$ 29,02	R\$ 107,95		3,72	3,72	R\$ -	R\$ 107,95	R\$ 107,95	0,00	R\$ -	0,00%
16.3	EMBRASAMENTO E ALVENARIA DE ELEVAÇÃO														
16.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	5,45	R\$ 30,97	R\$ 37,93	R\$ 206,71		5,45	5,45	R\$ -	R\$ 206,71	R\$ 206,71	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.2	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [REF.: SINAPI - 73935/02 - 08/2016]	M²	7,26	R\$ 80,13	R\$ 98,15	R\$ 712,56		7,26	7,26	R\$ -	R\$ 712,56	R\$ 712,56	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	10,89	R\$ 76,47	R\$ 93,67	R\$ 1.020,06		10,89	10,89	R\$ -	R\$ 1.020,06	R\$ 1.020,06	0,00	R\$ -	0,00%
16.4	ESQUADRIAS														
16.4.1	REVISÃO DE ESQUADRIA METÁLICA [REF.: ORSE - 1859 - 11/2024]	M²	43,02	R\$ 92,17	R\$ 112,90	R\$ 4.856,95			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	43,02	R\$ 4.856,95	100,00%
16.4.2	GRADE / GRADIL EM METALON FIXADA EM ALVENARIA OU CONCRETO [REF.: ORSE - 4716 - 11/2024]	M²	31,77	R\$ 225,46	R\$ 276,18	R\$ 8.774,23		31,77	31,77	R\$ -	R\$ 8.774,23	R\$ 8.774,23	0,00	R\$ -	0,00%
16.5	REVESTIMENTO														
16.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COÍHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 500L. AF. 10/2022	m²	24,50	R\$ 7,05	R\$ 8,63	R\$ 211,43		24,50	24,50	R\$ -	R\$ 211,43	R\$ 211,43	0,00	R\$ -	0,00%
16.5.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS [REF.: SINAPI - 87535 - 12/2024]	M²	119,59	R\$ 17,33	R\$ 21,22	R\$ 2.537,69			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	119,59	R\$ 2.537,69	100,00%
16.6	PINTURA														
16.6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF. 09/2023	m²	136,14	R\$ 3,39	R\$ 4,15	R\$ 564,98			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	136,14	R\$ 564,98	100,00%
16.6.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	136,14	R\$ 10,50	R\$ 12,86	R\$ 1.750,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	136,14	R\$ 1.750,76	100,00%
16.6.3	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	m²	149,59	R\$ 21,76	R\$ 26,65	R\$ 3.986,57			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	149,59	R\$ 3.986,57	100,00%
16.6.4	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	149,59	R\$ 44,35	R\$ 54,32	R\$ 8.125,72			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	149,59	R\$ 8.125,72	100,00%
16.7	PISO														
16.7.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	17,51	R\$ 191,17	R\$ 234,18	R\$ 4.100,49			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17,51	R\$ 4.100,49	100,00%
16.7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA E CM. AF. 10/2022	m²	399,81	R\$ 55,31	R\$ 67,75	R\$ 27.087,12			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	399,81	R\$ 27.087,12	100,00%
16.7.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO [REF.: ORSE - 21 - 11/2024]	M	145,90	R\$ 11,58	R\$ 14,18	R\$ 2.068,86			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	145,90	R\$ 2.068,86	100,00%
16.7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	145,90	R\$ 36,65	R\$ 44,89	R\$ 6.549,45			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	145,90	R\$ 6.549,45	100,00%
16.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
16.8.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 132,81	R\$ 162,69	R\$ 162,69			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 162,69	100,00%
16.8.2	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00	R\$ 426,74	R\$ 522,75	R\$ 522,75			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 522,75	100,00%
16.8.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	1,00	R\$ 192,25	R\$ 235,50	R\$ 235,50			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 235,50	100,00%
16.9	URBANIZAÇÃO														
16.9.1	BANCO COM ESTRUTURA EM METALON E DETALHES EM MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	UND	1,00	R\$ 525,79	R\$ 644,09	R\$ 644,09			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 644,09	100,00%

FABIO DE A. LUCENA
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

Assinado digitalmente por FABIO DE A. LUCENA
CPF: 02680909000104
Data: 2025.05.21 15:44:48.010



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA				DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/04/2025				LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses				PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/04/2025 à 21/05/2025				DATA: 21/05/2025	
CNPJ: 35.978.627/0001-04																					
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								PROCESSO LICITATÓRIO: 032//2025				CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 002/2025		CONTRATO: 093/2025				VALOR DO CONTRATO: R\$ 396.986,55		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 121.368,88	
PLANILHA CONTRATUAL								QUANTIDADES MEDIDAS				VALORES MEDIDOS (R\$)				SALDO A MEDIR					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%						
16.9.2	VASO DE CONCRETO, FCC= 15MPa - INCLUSIVE SELADOR, TEXTURA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	UND	1,00	R\$ 211,99	R\$ 259,68	R\$ 259,68			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 259,68	100,00%						
16.9.3	TOTEM COM ESTRUTURA METÁLICA E REVESTIMENTO EM ACM - INCLUSO BASE DE CONCRETO (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	UND	1,00	R\$ 707,43	R\$ 866,60	R\$ 866,60			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 866,60	100,00%						
17.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA																				
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: SINAPI - 9537 - 11/2018)	M²	516,23	R\$ 2,88	R\$ 3,52	R\$ 1.817,12			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	516,23	R\$ 1.817,12	100,00%						
						R\$ 396.986,55				R\$ -	R\$ 121.368,88	R\$ 121.368,88			R\$ 275.617,67	69,43%					
										VALOR CONTRATADO		R\$ 396.986,55									
										VALOR ACUMULADO		R\$ 121.368,88									
										SALDO DO CONTRATO		R\$ 275.617,67									
										VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 121.368,88									

FABIO
Fabio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 026809-DIPg

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:



14/04/2025

MANHÃ X

TARDE X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR
- 2) DEMOLIÇÃO INTERNA
- 3) CERCAMENTO DA OBRA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
 DN: C=BR, O=CPA-Rural, OU=Secretaria de Recauda
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB - ACSPF, AI, OU=CPM
 Brasil, OU=32418270002196, OU=
 daviwilson@cpa-rural.gov.br, OU=DAVI WILSON LUCENA DO
 O:01327337495
 Razão: Evêntual neste documento
 Localidade:
 Data: 2025.08.21 15:37:27.0299Z
 Font: PDF Reader Varsini, ZG4.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTR

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCO DE EDIFICIOS LTD-35879627000104
NO: C1BR, 01/03/2024, 6:49H, L35879627000104
MONTE, DO-Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OLIVEIRA e CNPJ A1, DO-35879627000104
OLIVEIRA e CNPJ A1, DO-35879627000104
CONSTRUCO DE EDIFICIOS LTD-35879627000104
Razão: Eu revisei este documento
Utilização:
Data: 2025.05.11 15:34:01.63300
Fórmula PDF Reader Version: 2024.3.0

FABIO DE A. LUSTOS
Engenheiro Civil
CREA:026109-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 2

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
15/04/2025



MANHÃ X
TARDE X
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR
- DEMOLIÇÃO INTERNA
- CERCAMENTO DA OBRA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO O:01327337495
Nº 2025.05.21 15:34:01-20737
Data: 2025.05.21 15:34:01-20737
Firm PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCOAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCOAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Nº 2025.05.21 15:34:01-20737
Data: 2025.05.21 15:34:01-20737
Firm PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE
CONTRATANTE

Handwritten signature of Fábio de A. Lustos

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 3

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
16/04/2025



MANHÃ X
TARDE X
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR
- 2) DEMOLIÇÃO INTERNA
- 3) CERCAMENTO DA OBRA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 01327337495
DN: CN=Davi Wilson, OU=Secretaria de Renda
Fiscal do Brasil, RPT, OU=RS e CNP, AT, OU=RS
BRASIL, OU=1541407900195, OU=
www.sistemafiscal.gov.br, CN=DAVI WILSON LUCENA DO
01327337495
Razão: Eu revisto este documento:
Localizado:
Data: 2025.05.21 15:33:27-03'00'
File: PDF Reader Versão: 2024.1.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
DN: CN=MM DA SILVA OLIVEIRA, OU=Secretaria de Renda
Fiscal do Brasil, RPT, OU=RS e CNP, AT, OU=RS
BRASIL, OU=1541407900195, OU=
www.sistemafiscal.gov.br, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Razão: Eu revisto este documento:
Localizado:
Data: 2025.05.21 15:34:01-03'00'
File: PDF Reader Versão: 2024.1.0

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE
CONTRATANTE

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
17/04/2025



MANHÃ X
TARDE X
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR
- DEMOLIÇÃO INTERNA
- CERCAMENTO DA OBRA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
NO CHAVE: CHAVE:35978627000104
MONTA: 02/04/2025 15:34:01-02700
RFE: 02/04/2025 15:34:01-02700
O:01327337495
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Pasta: 02/04/2025 15:34:01-02700
Data: 2025.04.21 15:34:01-02700
File: PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 5

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
19/04/2025



MANHÃ X
TARDE X
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR
- 2) DEMOLIÇÃO INTERNA
- 3) CERCAMENTO DA OBRA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO 01327337495
MD CHBR, CN=CHBR, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, C=Brasil, ou=ICP-Brasil
BRANCO, OU=DAVI WILSON LUCENA DO 01327337495
Revoked: 2025.04.21 15:32:07-03702
First PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
MD CHBR, CN=CHBR, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, C=Brasil, ou=ICP-Brasil
Revoked: 2025.04.21 15:34:01-03702
First PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE
CONTRATANTE

[Handwritten signature of Fábio de A. Lustos]

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

№ 6

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:



22/04/2025



X



X



MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR
- 2) DEMOLIÇÃO INTERNA
- 3) CERCAMENTO DA OBRA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:0132733749

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DD 0.01327337485
NDR: C=BR, O=ICP-BRasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ICP-Brasil, c=BR, o=ICP-BRASIL, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ICP-Brasil, email=Davi.Wilson.Lucena@re.faz.gov.br
Voz: 011-33411679000195, OU=Vozconferencia, CN=DAVI WILSON LUCENA
DD 0.01327337485
Razão: Eu revirei este documento
Localização:
Data: 2025.05.21 16:53:27-03'00'
Email PDF: Rastrear Visão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104

CONTRATADA

Assinado digitalmente por M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCO DE EDIFICIOS LTO.35978677000164
NO C=BR, O=DIGITAL, S=SE, L=SAO JOAQUIM DO
MONTES, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RPB e CN=PA 1, DN=35978677000164,
OU=vidaeconferencia, CN=M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCO DE EDIFICIOS LTO.35978677000164
Razão: Eu revisto este documento
Localize:
Data: 2025.05.21 15:34:01-0300
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

№ 7

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDERECO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:



23/04/2025



X



X



MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- | | |
|-----|-------------------|
| 1) | DEMOLIÇÃO DE LAJE |
| 2) | DEMOLIÇÃO INTERNA |
| 3) | |
| 4) | |
| 5) | |
| 6) | |
| 7) | |
| 8) | |
| 9) | |
| 10) | |
| 11) | |
| 12) | |
| 13) | |
| 14) | |

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

**DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495**

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO:01327337495
Id: C=BR, CN=CPA-Sinal, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-CCPF-A1, OU=CPM
(PRACDIO), OU=3416070002195, GN=
www.sic.gov.br, CN=Davi Wilson Lucena DO:01327337495
Data: 2015.06.21 15:32:27-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUTORA DE EDIFICIOS LTD-35978627000104
MD: C#BR, O=C#P#Brasil, E=S#E, L=S#AO JOAO DO
MONTI, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OU=CP#B, CN=U#A1, DN=35978627000104
O=D#conferencia, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUTORA DE EDIFICIOS LTD-35978627000104
Razão: Eu revizei este documento.
Localização:
Data: 2025.05.21 15:34:01-0300
Font: PDF Reader Version: 2024.2.0

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 8

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
24/04/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR
- DEMOLIÇÃO INTERNA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
em 2025.05.21 11:33:27-0302
Data: 2025.05.21 11:33:27-0302
Função: Responsável Técnico - RDT-024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
em 2025.05.21 11:34:01-0302
Data: 2025.05.21 11:34:01-0302
Função: Responsável Técnico - RDT-024.3.0

FABIO
CONTRATANTE

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 9

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
25/04/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO SUPERIOR
- 2) DEMOLIÇÃO INTERNA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCÃO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Fábio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 026609-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:

26/04/2025



MANHÃ

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ALVENARIAS INTERNAS
- 2) ALVENARIAS DE MURETA
- 3) MONTAGEM DE VIGAS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO

O:0132733749

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 0.01327337485
NE: C=BR, O=CIP-Fiscal, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, A=CP, A=CE
[BRANCO], OU=0.013273374850001, OU=0.01327337485
=videoconferencia, CN=DAVI WILSON LUCENA DO
0.01327337485

Resumo: Este revizual este documento
Localização:
Data: 2025-06-21 15:33:27-0300
Email: PDF Reader Vienna: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104

CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUTORA DE EDIFICAÇÕES LTDA 3587862700010
NO CHBR, CHIEPBrasil, S/PE, LISAJO JOAGUIM D
MONTTE, OJ-Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OJ=SPF-S-e-CPV A1, OJ=3341357000105,
OJ=Descontofinanc, OJ=CPV M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUTORA DE EDIFICAÇÕES LTDA 3587862700010
Razão: Eu revisto este documento
Localização:
Data: 2025/05/21 15:34:01-03'00'
Font PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 026009-D/PE

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 11

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
28/04/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ALVENARIAS INTERNAS
- 2) ALVENARIAS DE MURETA
- 3) MONTAGEM DE VIGAS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 0101327337495
NO: CN=DAVI WILSON LUCENA DO, OU=Secretaria de Recada
Federal do Brasil - RFB, OU=RPB wCHP A1, OU=SEM
BRASIL, OU=BRASIL, OU=BRASIL, OU=BRASIL, OU=BRASIL
votocorreio@brasil.gov.br, CN=DAVI WILSON LUCENA DO
0101327337495
Razão: Eu revisto este documento
Data: 2025.05.21 15:33:27-03'02"
Firm: PPK Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
NO: CN=DAVI WILSON LUCENA DO, OU=Secretaria de Recada
Federal do Brasil - RFB, OU=RPB wCHP A1, OU=SEM
BRASIL, OU=BRASIL, OU=BRASIL, OU=BRASIL, OU=BRASIL
votocorreio@brasil.gov.br, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Razão: Eu revisto este documento
Data: 2025.05.21 15:34:51-03'02"
Firm: PPK Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 0013809-D/PE
CONTRATANTE

FABIO DE A. LUSTOSA
Engenheiro Civil
CREA 0013809-D/PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:

29/04/2025



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ALVENARIAS INTERNAS
- 2) ALVENARIAS DE MURETA
- 3) MONTAGEM DE VIGAS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

[illegible]

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTR

Assinado digitalmente por N M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUTORA DE EDIFICIOS LTD 35978572000194
ND: C=BR, O=CPQ-Brasil, E=PE, L=BAO JOAQUIM D
MONTE, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OU=CP-BR e CN=P A1, OU=334107000195,
OU=Indoconferencia, CN=M D DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUTORA DE EDIFICIOS LTD 35978572000194
Razão: Eu revisto este documento
Localização:
Data: 2025.05.21 15:34:01-03'00"
Font PDF Reader Version: 2024.3.0

FABIO
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 13

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
30/04/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ALVENARIAS INTERNAS
- 2) ALVENARIAS DE MURETA
- 3) MONTAGEM DE VIGAS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DOI: 01327337495
Nº: 01327337495, CN=DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495, OU=DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Data: 2025.05.21 15:34:01-0200
Fórmula: Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
DOI: 35978627000104
Nº: 35978627000104, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
O:35978627000104, OU=M M DA SILVA OLIVEIRA
O:35978627000104
Data: 2025.05.21 15:34:01-0200
Fórmula: Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. BUSTOS
Engenheiro Civil
CREA 0268089-D/PE
CONTRATANTE

Handwritten signature of Fábio de A. BUSTOS

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 14

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
02/05/2025



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ALVENARIAS INTERNAS
- 2) ALVENARIAS DE MURETA
- 3) MONTAGEM DE VIGAS
- 4) ESCAVAÇÕES E ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

**DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495**

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
 MG, CN=Davi Wilso, OU=Brasil, C=Brasla, S=Recatela Federal do Brasil - RFR, OU=RFR - UFPR, OU=UFPR, BR=BRASIL, DN=Davi Wilson Lucena do O:01327337495, email=davilucena@ufpr.br, ou=Davi Wilson Lucena do O:01327337495
 Razão: Se revistar este documento
 Localizao:
 Data: 2025.08.21 15:22:27-020257
 Fout PDF Reader Versio: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTR

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCO DE EDIFICIOS LTD-35878627000154
NQ CNR, OICP-Abril, GPE, LISA JOAQUIM D
MONTI, OJ-Servicos da Resaca Federal do Brasil
RFL, OJ-UPH-1, CNPU A1, OJ-334 1067000125,
OJ-Pedagogia, CNR M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCO DE EDIFICIOS LTD-35878627000154
Razão: Os revistos este documento
Localização:
Data: 2025/01/15 15:34:01-03:00
Fonte PDF Reader Version: 2024.3.0


CONTRATANTE
 Fábio de A. Lustosa
 Engenheiro Civil
 CREA 026809-D/PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 15

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
05/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- ALVENARIAS INTERNAS
- ALVENARIAS DE MURETA
- MONTAGEM DE VIGAS
- ESCAVAÇÕES E ENCANAÇÃO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OCCORRÊNCIAS

-
-

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DOI: 01327337495
Nº: 01327337495, O:01327337495
Pessoa do Brasil - RFB, CNPJ: 01327337495, CNPJ: 01327337495
BRASIL, CNPJ: 01327337495, CNPJ: 01327337495
Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO
DOI: 01327337495
Nº: 01327337495, O:01327337495
Pessoa do Brasil - RFB, CNPJ: 01327337495, CNPJ: 01327337495
BRASIL, CNPJ: 01327337495, CNPJ: 01327337495
Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO
DOI: 01327337495
Nº: 01327337495, O:01327337495
Pessoa do Brasil - RFB, CNPJ: 01327337495, CNPJ: 01327337495
BRASIL, CNPJ: 01327337495, CNPJ: 01327337495

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
DOI: 35978627000104
Nº: 35978627000104, O:35978627000104
Pessoa do Brasil - RFB, CNPJ: 35978627000104, CNPJ: 35978627000104
BRASIL, CNPJ: 35978627000104, CNPJ: 35978627000104
Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
DOI: 35978627000104
Nº: 35978627000104, O:35978627000104
Pessoa do Brasil - RFB, CNPJ: 35978627000104, CNPJ: 35978627000104
BRASIL, CNPJ: 35978627000104, CNPJ: 35978627000104

FABIO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 026809-0/DPE
CONTRATANTE

Handwritten signature of Fabio da Silva.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 16

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
06/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DN: CN=Davi Wilson Lucena, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, O=CPFR A1, C=BR
Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DN: CN=Davi Wilson Lucena, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, O=CPFR A1, C=BR

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
DN: CN=M M DA SILVA OLIVEIRA, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, O=CPFR A1, C=BR
Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
DN: CN=M M DA SILVA OLIVEIRA, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, O=CPFR A1, C=BR

Fábio de A. Lusas
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
07/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO
01/01/2025 10:34:00
Nº 01327337495
Fórmula de Assinatura: DAVI WILSON LUCENA DO
CPF: 01327337495
Data: 05/05/2025 10:34:00
Tipo: PDF (Assinatura) - PDF 1.0

M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Nº 01327337495
Fórmula de Assinatura: M M DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 01327337495
Data: 05/05/2025 10:34:00
Tipo: PDF (Assinatura) - PDF 1.0

Fábio de A. Lusins
Engenheiro Civil
CREA 026803-9-DIPE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 18

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
08/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 01327337495
ND: CN=DAVI WILSON LUCENA, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RS, CN=RS, CN=RS
Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO
01327337495
Data: 2025.05.21 15:32:14-03'00"
Fórmula: RS-256, RS-256

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
ND: CN=M M DA SILVA OLIVEIRA, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RS, CN=RS, CN=RS
Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Data: 2025.05.21 15:34:01-03'00"
Fórmula: RS-256, RS-256

Fábio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 020809-D/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 19

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
09/05/2025



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

**DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495**

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
 NG: CN=DAVI, OU=CPA-Invest, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SPB, OU=CPF A1, OU=EMBRASID, OU=03041607000186, OU=volocreditoassociados, OU=DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
 Razão: Eu revisei este documento
 Localização: 19/03/2015 08:05:21 15:33:27.037057
 Fossil PGP (Render Varsão): 2034.3.0

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTR.

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONTRIBUIR DE EDIFICIOS LTDA-35678572000104
ND: CNBR, CN-CP, BRAS, S/PE, L-BAD JOAQUIM DO
MONTE, CO-Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB, OU-RFB e CNPJ A1, OU-33418079000195,
OU-Indiferença, CN-IM M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCO DE EDIFICIOS LTD-35678572000104
Rúbrica. Em papel este documento
Localização:
Data: 2025.05.21 15:34:01-53707
Formato PDF Reader Version: 2024.3.8

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
12/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 01327337495
Nº 01327337495, CN=DAVI WILSON LUCENA DO, OU=MD
CONSTRUTORA, CN=MD CONSTRUTORA, CN=MD CONSTRUTORA
DO 01327337495
Data: 2025.05.21 15:33:27-03'00"
Firm: PGP Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Nº 35978627000104, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104, OU=MD
CONSTRUTORA, CN=MD CONSTRUTORA, CN=MD CONSTRUTORA
DO 01327337495
Data: 2025.05.21 15:34:01-03'00"
Firm: PGP Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lusio
CONTRATANTE Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 21

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
13/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO
OO 01327337495
MD 0480, CH-CP-Brasil, CN=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RSB-ACDF-A1, OU=SEM
BRASIL, OU=35414767000104, OU=CONSTRUCOES DE EDIFICIOS
LTD-35978627000104
Data: 2025.05.21 15:32:47-0700
Fonte PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
MD 0480, CH-CP-Brasil, CN=RSB-ACDF-A1, OU=SEM
BRASIL, OU=35414767000104, OU=CONSTRUCOES DE EDIFICIOS
LTD-35978627000104
Data: 2025.05.21 15:34:01-0700
Fonte PDF Reader Versão: 2024.3.0

FJA Fabio de A. Lucena
Engenheiro Civil
CREA 026809-0/PE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 22

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
14/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DN: CN=Davi Wilson Lucena, OU=MD Construções e Projetos, O=MD Construções e Projetos, C=BR
Data: 2025.05.21 15:34:15.0370
Fórmula: 2024.3.0

M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCÃO DE EDIFÍCIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
DN: CN=M M DA SILVA OLIVEIRA, OU=MD Construções e Projetos, O=MD Construções e Projetos, C=BR
Data: 2025.05.21 15:34:15.0370
Fórmula: 2024.3.0

Fábio de Alencar
Engenheiro Civil
CREA: 028809-DIPE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
15/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANEAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 01327337495
NE: CN=DAVI WILSON LUCENA, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ A1, OU=SEM
BRASIL, O=DIGITAL CERTIFICADO, CN=DAVI WILSON LUCENA DO
01327337495
Razão: Eu revisto este documento:
Localização:
Data: 2025.05.21 15:33:27-03'02"
Versão: 3.0.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
NE: CN=M M DA SILVA OLIVEIRA, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ A1, OU=SEM
BRASIL, O=DIGITAL CERTIFICADO, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Razão: Eu revisto este documento:
Localização:
Data: 2025.05.21 15:34:01-03'02"
Versão: 3.0.0

FAB
Fábio de A. Lusio
Engenheiro Civil
CREA: 026809-DIPE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO
ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
16/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Aprovado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO 01327337495
Nº 1468, 01/05/2025, 09:05:00, 01/05/2025
Fórmula de Assinatura: DAVI WILSON LUCENA DO
01327337495
Data: 2025.05.21 10:32:17, 01/05/2025
Fórmula de Assinatura: DAVI WILSON LUCENA DO
01327337495

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Aprovado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Nº 1468, 01/05/2025, 09:05:00, 01/05/2025
Fórmula de Assinatura: M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
Data: 2025.05.21 10:34:51, 01/05/2025
Fórmula de Assinatura: M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104

Fabio de L. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 026809-DIPE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

№ 25

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
19/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
 DN: O=DASI, CN=DASI, OU=Secretaria de Racieta
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=DASI
 SPANHO, OU=DASI, OU=1307337495, OU=
 www.dasi.gov.br, OU=DAVI WILSON LUCENA, OU=
 O=1307337495
 Razão: Eu levei este documento
 para o
 Data: 2020.05.21 15:37:47-0700
 Font PDF: Racieta Vendas: 2024.30

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTR

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCO DE EDIFICIOS LTD.35697852700010
ND: C=BR, O=CP.Brasil, S=PE, L=SAO JOAQUIM DO
MONTI, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OU=RFB-e-CNPJ A1, OU=33415070000135
O=Industria-conferencia, CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCO DE EDIFICIOS LTD.35697852700010
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2023.06.21 15:34:01-0300
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fábio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA.026809-DIPE
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

№ 26

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:

20/05/2025



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTR

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA 366778527000150
CN=CHR, O=DEP-BRASIL, S=PE, I=SAO JOAO DEL REI
DE MONTE, OU=Secretaria do Estado Federal do Brasil
RFB, OU=PE-A, CN=UAT, OU=3341007000150150
C=BRASIL, OU=CN=M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA 366778527000150
Razão: Eu sou o emissor deste documento.
Lançamento:
Data: 2025.05.21 15:34:01-0300
Firm Post Reader Version: 2024.3.0

FABIO DE A. LUSTOS
Engenheiro Civil
CREA: 026809-D/PE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 27

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA SUELI VITAL DE ARAÚJO

ENDEREÇO: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

INÍCIO: 14/04/2025

DATA:
21/05/2025



MANHÃ
TARDE
NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	6	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	5	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CHAPISCO
- 2) EMBOÇOS
- 3) CISTERNA
- 4) ENCANAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
DN: CN=Davi Wilson Lucena do, OU=MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS, O=MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS, C=BR
Data: 2025.05.21 15:34:01-03'00
Fim do PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCOAO DE
EDIFICIOS
LTD:35978627000104
CONTRATADA

Assinado digitalmente por M M DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCOAO DE EDIFICIOS LTD:35978627000104
DN: CN=M M DA SILVA OLIVEIRA, OU=MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS, O=MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS, C=BR
Data: 2025.05.21 15:34:01-03'00
Fim do PDF Reader Versão: 2024.3.0

Fabio de A. Lustos
Engenheiro Civil
CREA 026809-DIPE

CONTRATANTE
